




REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO				2016				TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO																			
NOMBRE <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO</u>				CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA				FECHA DEL REPORTE																			
DOMICILIO COMPLETO <u>CARRETERA TIERRA BLANCA-LORETO KM 22 LORETO, ZACATECAS. C.P. 98500</u>				FECHA DE INICIO <table border="1"><tr><td>15</td><td>7</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>				15	7	2016	DÍA	MES	AÑO	FECHA <table border="1"><tr><td>30</td><td>12</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>				30	12	2016	DÍA	MES	AÑO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL			
15	7	2016																									
DÍA	MES	AÑO																									
30	12	2016																									
DÍA	MES	AÑO																									
				FECHA DE TERMINACIÓN <table border="1"><tr><td>6</td><td>1</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>				6	1	2017	DÍA	MES	AÑO	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA													
6	1	2017																									
DÍA	MES	AÑO																									

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEX0ES 2015	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, ZACATECAS.	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 13,498,683.47	49%	\$ 6,601,209.57	752	665	27%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

200 AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : <u>MIRIAM GONZÁLEZ CASTILLO</u> CARGO : <u>JEFA DE RECURSOS MATERIALES</u> CORREO ELECTRONICO : <u>rm_dloreto@tecnm.com</u> TEL 10 DIGITOS : <u>499-68-2-51-51 / 52 / 53</u>	FIRMA 	NOMBRE : <u>M.E. PATRICIA DEL CARMEN BARNAL LARRALDE</u> DIRECTORA GENERAL DEL ITSIL	VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO 	
--	---	---	---	--

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LORETO
Dirección General



CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS ORTIZ


MEXICAPAN # 1414-A COL. DÍAZ ORDAZ SECCIÓN I, ZACATECAS,
ZAC, TELS: 166-09-90, NEXTEL: 153-91-27, I.D.: 62*289660*1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

CIMENTACIÓN

ESTIMACIÓN NO. TRES

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2016

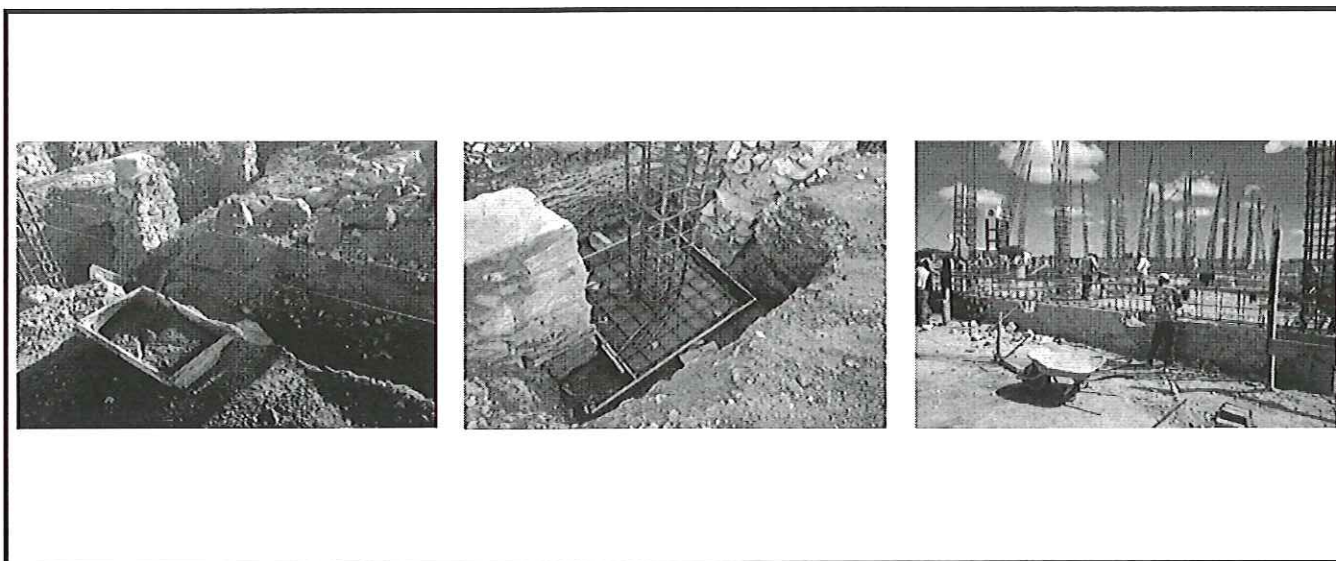

C. JAIME ORTIZ MACIAS

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA

TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. CUATRO

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2016

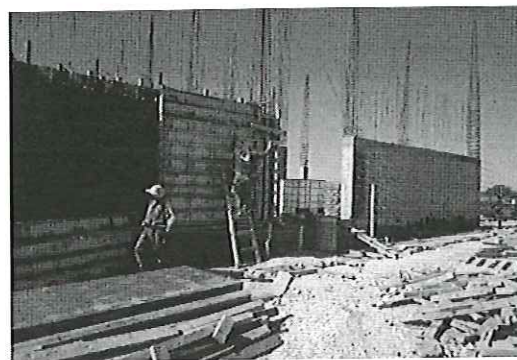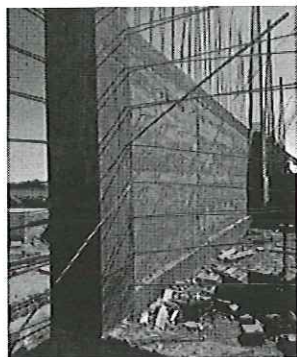

JAIME ORTIZ MACIAS
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45




ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. CUATRO

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2016

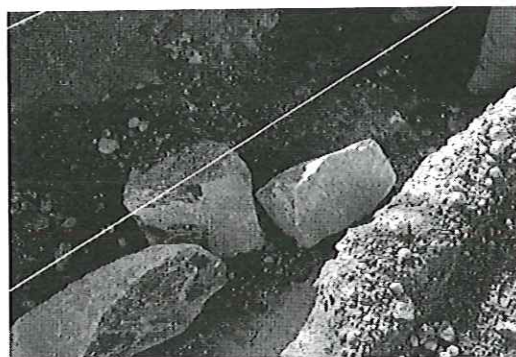

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA






ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. CINCO

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016

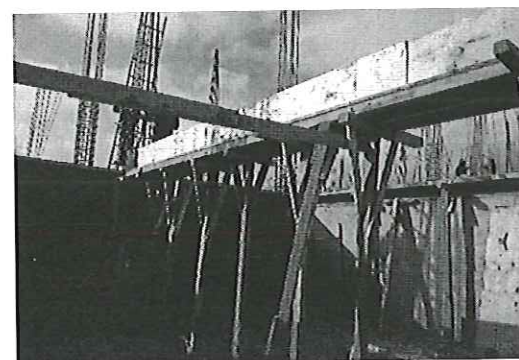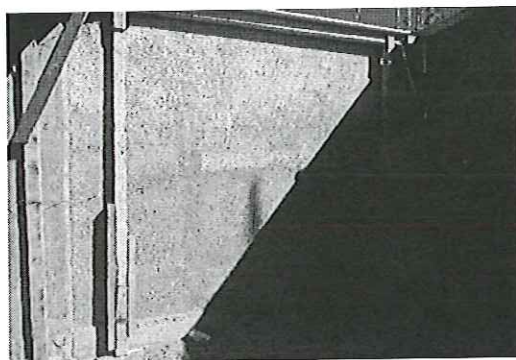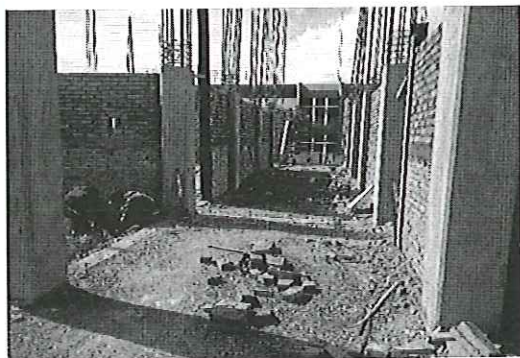

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA

TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. CINCO

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016

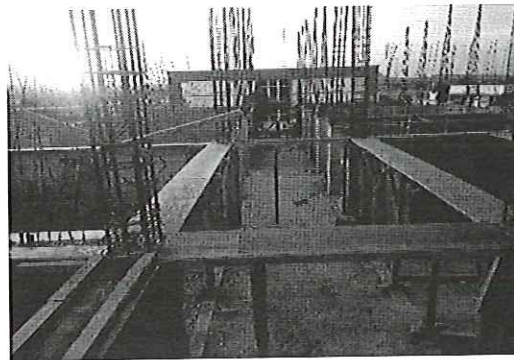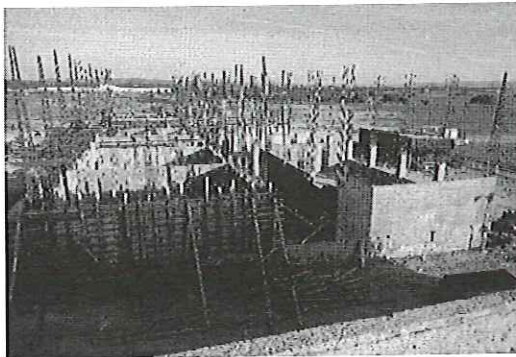

JAIME ORTIZ MACIAS
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO

JAIME ORTIZ MACIAS
CALLE MEXICAPAN No. 14141-1
COL. DIAZ ORDAZ, ZACATECAS, ZAC.
C.P. 98020
TEL. (492) 166 0990
R.F.C. OIMJ-701125-V45



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




ZACATECAS
TRABAJO DIFERENTE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN CARRETERA
TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN NO. SEIS

FECHA: 17 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016

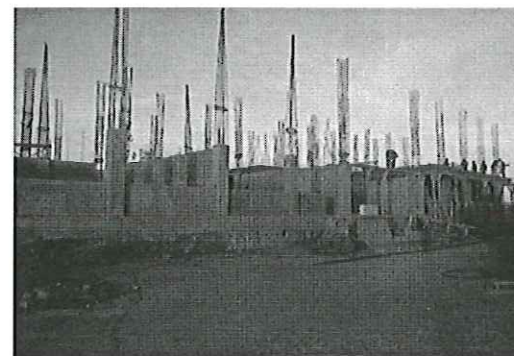

JAIME ORTIZ MACIAS
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA

ARQ. LUIS FERNANDO ROMÁN ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

I.S.C. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LORETO
