

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO
DOMICILIO COMPLETO CARRETERA TIERRA BLANCA-LORETO KM 22
LORETO, ZACATECAS. C.P. 96900

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO 11 7 2016
DÍA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN 6 1 2017
DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA 30 9 2016
DÍA MES AÑO

2016

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEX005 2015	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, ZACATECAS.	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 13,498,983.47	35%	\$ 4,713,005.71	752	695	7%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

1ER AVANCE TRIMESTRAL JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : MIRIAM GONZÁLEZ CASTILLO
CARGO : JEFA DE RECURSOS MATERIALES
CORREO ELECTRONICO : m.gonzalez@tecmmx
TEL 10 DÍGITOS : 499-99-2-51-51 / 52 / 53

FIRMA *Miriam*

NOMBRE :

M.E. PATRICIA DEL CARMEN BARNAL LARRALDE
DIRECTORA GENERAL DEL ITSJ

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

[Firma]
FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LORETO
Dirección General

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



CONSTRUCCION Y ACABADOS ORTIZ


MEXICAPAN # 1414-A COL. DIAZ ORDAZ SECCION I, ZACATECAS,
ZAC, TELS; 166-09-90, NEXTEL: 153-91-27, I.D.: 62*289660*1

OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN
CARRETERA TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ALBUM FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. UNO

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2016

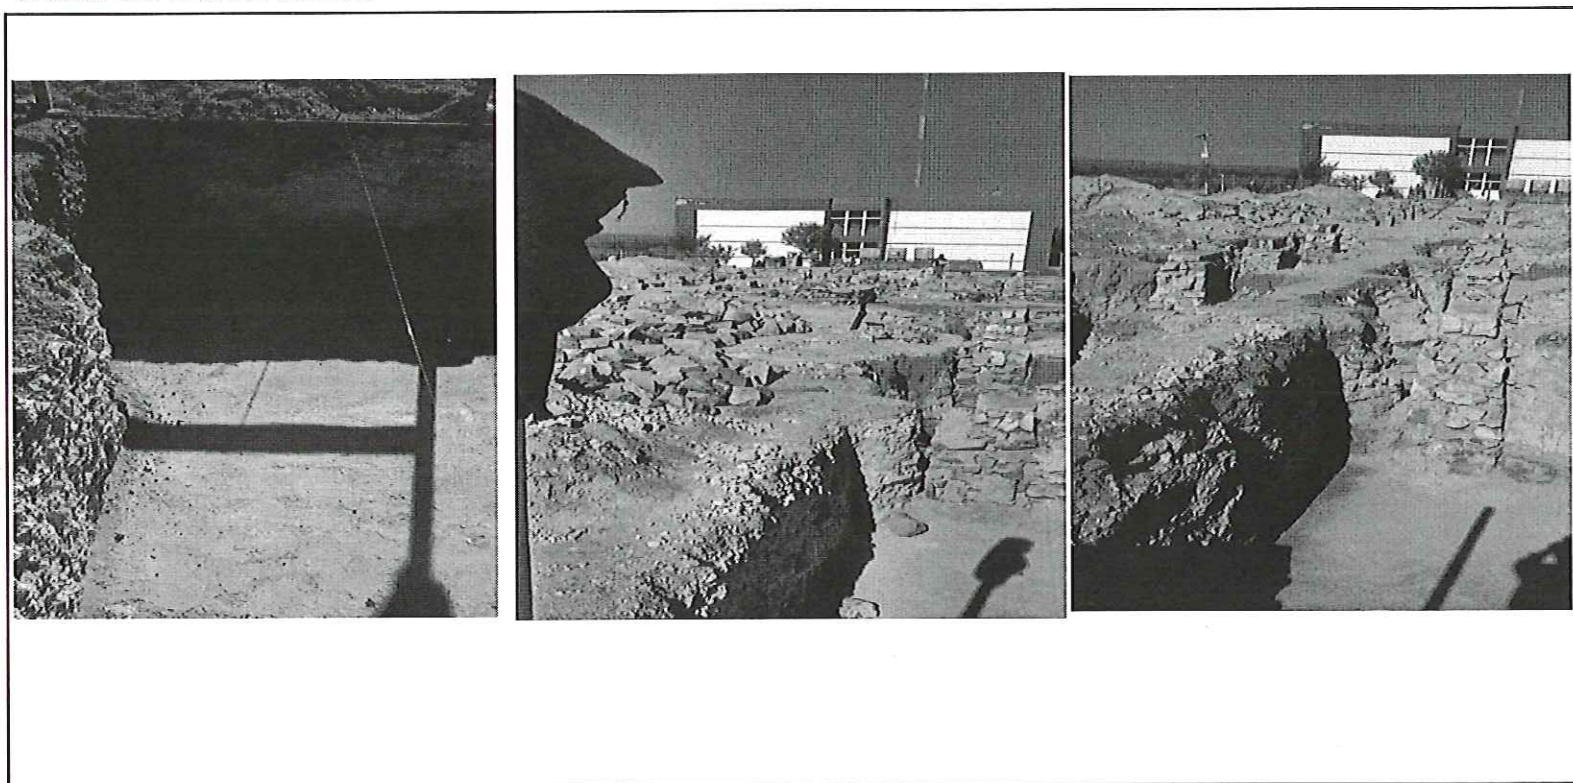

C. JAIME ORTIZ MACIAS



CONSTRUCCION Y ACABADOS ORTIZ


MEXICAPAN # 1414-A COL. DIAZ ORDAZ SECCION I, ZACATECAS,
ZAC, TELS; 166-09-90, NEXTEL: 153-91-27, I.D.: 62*289660*1

OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN
CARRETERA TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.

ALBUM FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. UNO

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2016

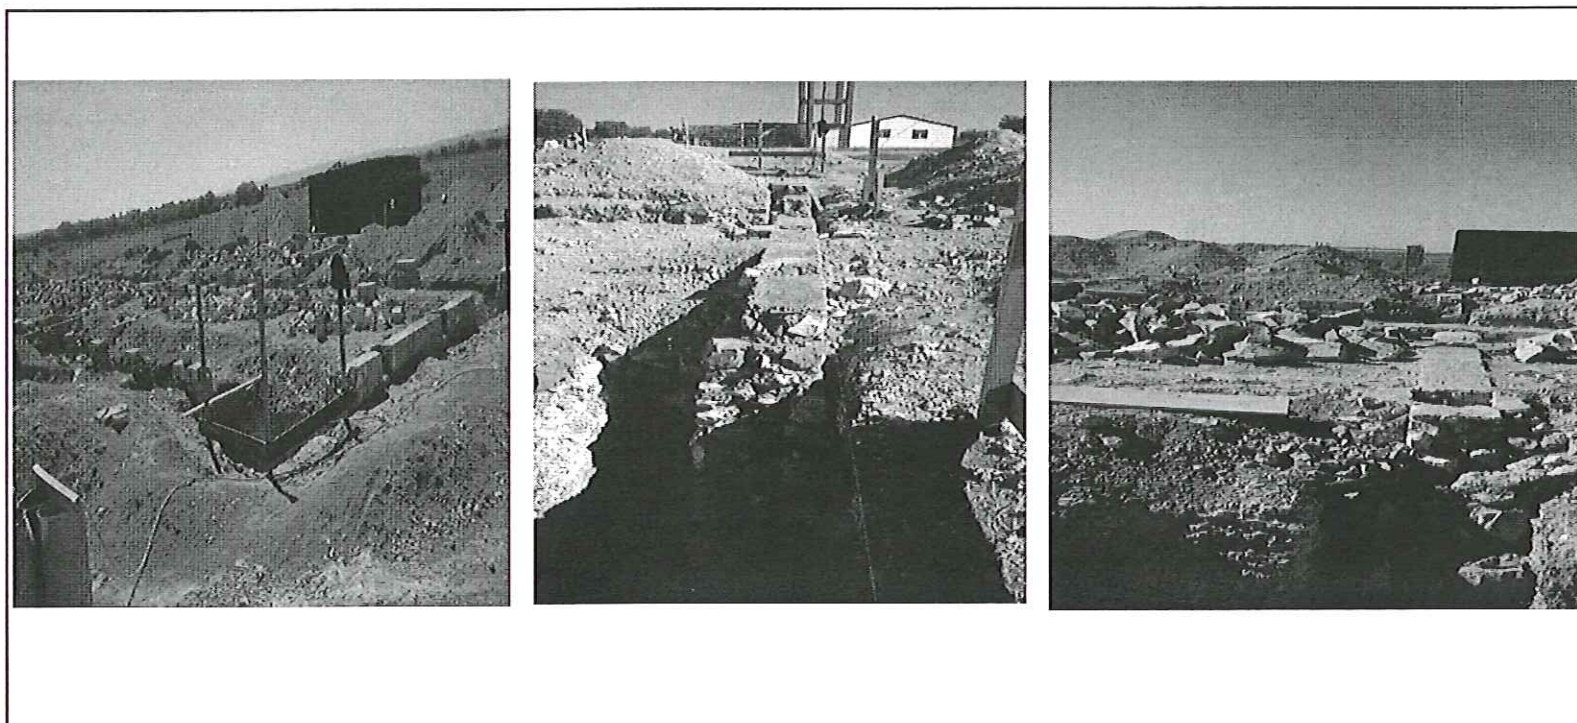

C. JAIME ORTIZ MACIAS



CONSTRUCCION Y ACABADOS ORTIZ
MEXICAPAN # 1414-A COL. DIAZ ORDAZ SECCION I, ZACATECAS,
ZAC, TELS; 166-09-90, NEXTEL: 153-91-27, I.D.: 62*289660*1

OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, UBICADO EN
CARRETERA TIERRA BLANCA - LORETO KM 22 LORETO ZAC.
ALBUM FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. UNO
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2016

